Client SOCIÉTÉ CLIENTE
Adresse masquée

RAPPORT DE VERIFICATION

Lieu d'intervention SITE D'INTERVENTION
Adresse masquée

Rapport N° : 112026117354 Rev 00

Date de visite : 09/11/2026

Inspecteur : E. JONARD

Prochaine vérification périodique : 09/05/2027

Numéro de parc : XXXX

Immatriculation : XX

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES
DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Prescriptions applicables aux utilisateurs

TEXTES RÉGLEMENTAIRES

- **Code du travail**

- Article R4323-23 : - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

- Article R4323-24 : - Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

- **Arrêtés**

Appareils de Levage : Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Machines : Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques.
Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles.
Portes : Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.
Échafaudages : Arrêté du 21 décembre 2004 et Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 relatifs aux vérifications d'échafaudages.
Ascenseurs : Décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 et Arrêté du 29 décembre 2010 relatifs aux vérifications des ascenseurs
E.P.I. : Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet de vérifications générales périodiques. *Réservoirs sous pressions* : Arrêté du 27 novembre 2017 relatif à l'exploitation des équipements sous pression.

OBLIGATIONS POUR L'UTILISATEUR

Le chef d'établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire (arrêté du 1 mars 2004 - art. 3).
Pendant la vérification, le chef d'établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil ainsi qu'à la direction des manœuvres et aux réglages éventuels (arrêté du 1 mars 2004 - art. 3).
le chef d'établissement doit mettre à la disposition de la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires notamment :

- La déclaration ou le certificat de conformité de l'appareil.
- Le carnet de maintenance (pour les appareils de levage).
- Les rapports des vérifications précédentes.
- La notice d'instructions de l'appareil.

Le chef d'établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun de ces appareils de levage (arrêté du 2 mars 2004). Le chef d'établissement doit établir et tenir à jour un registre de sécurité.

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE

Ces vérifications, conformément aux prescriptions réglementaires, portent sur l'examen d'état de conservation des parties visibles sans démontage et les essais de fonctionnement.

- *Levage* : Les appareils et accessoires ont une périodicité annuelle, toutefois, cette périodicité est semestrielle pour les appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 de l'arrêté du 01/03/2004, les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail. La périodicité est trimestrielle pour les appareils mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
- *Machines et engins de terrassement à conducteur porté* : La périodicité est trimestrielle ou semestrielle selon le cas.
- *Portes* : La périodicité est semestrielle.
- *Échafaudages* : La périodicité est trimestrielle.

- *Ascenseurs* : la périodicité est semestrielle pour les suspentes et annuelle pour l'appareil.
- *E.P.I.* : La périodicité est annuelle.
- *Réservoirs sous pression* : La périodicité de l'inspection est de 4 ans, toutefois, la première vérification périodique doit intervenir dans les trois ans qui suivent sa mise en service. a requalification est de 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans selon le cas.

VERIFICATION AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE

- **Levage**

Conformément aux dispositions propres aux arrêtés susvisés, les appareils de levage mus mécaniquement ou par la force humaine et les accessoires de levage doivent faire l'objet de tout ou partie des examens et essais suivants, lors de leur mise 1) ou remise 2*) en service:

EXAMENS ET ESSAIS		CIRCONSTANCES IMPOSANTS DES EXAMENS OU ESSAIS
examen d'adéquation	1)	lors de la mise en service dans l'établissement (neuf, occasion ou location)
examen de montage et d'installation	2a)	en cas de changement de site d'utilisation, de configuration, de conditions d'utilisation sur un même site.
essais de fonctionnement	2b)	à la suite d'un démontage suivi d'un remontage
examen de l'état de conservation	2c)	après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant un organe essentiel.
épreuves statiques et dynamiques	2d)	à la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel.

Toutefois, les appareils soumis à des changements de site d'utilisation et ne nécessitant pas l'aménagement de supports particuliers sont dispensés de la vérification prévue au cas 2a) ci-dessus, à condition d'avoir fait l'objet dans cette configuration des examens et essais de mise en service du cas 1) ci-dessus et, depuis moins de six mois, de la vérification générale périodique.

Nota: Les épreuves permettent de s'assurer expérimentalement de l'absence d'anomalie préjudiciable à la solidité et/ou à la stabilité. A défaut de présentation des documents prévus par l'arrêté du 01 mars 2004, sans avis formalisé du chef d'établissement, les épreuves sont réalisées conformément aux dispositions du contrat, dans les conditions prévues par le fabricant et à défaut dans les conditions définies par les textes de références.
Le vérificateur ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués par les épreuves à l'appareil ou à son support.
L'examen de montage et d'installation est limité aux éléments assemblés sur le site d'utilisation et réalisé sur la base des informations contenues dans la notice d'instructions du fabricant.

DEFINITION ET CONTENU DES MISSIONS DE BASE

La mission comprend les seules opérations décrites dans le présent rapport, réalisées dans les limites définies ci-dessous.
Pour les équipements de travail, les vérifications périodiques, les vérifications avant mise ou remise en service, sont réalisées dans le respect des contenus, des limites d'investigation et des exclusions de mission définis dans les cahiers des charges de la profession.

Pour les autres équipements, les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base comportent, l'examen visuel de l'état de conservation des parties de l'équipement, visibles et accessibles sans démontage et en sécurité, l'essai de fonctionnement de l'équipement et des dispositifs de protection en place.

LIMITES ET EXCLUSIONS AUX MISSIONS DE BASE

En l'absence d'un opérateur qualifié à la conduite et/ou des moyens d'accès sécurisés, la vérification est limitée à l'état de conservation des parties visibles et accessibles de plain-pied, équipement à l'arrêt. Les limites de la vérification sont alors précisées dans le rapport.

L'examen de montage et d'installation exclut notamment, tout essai, contrôle géométrique ou métrologique, toute vérification des caractéristiques mécaniques des supports, massifs, ancrages, fixations, ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et, le cas échéant, de leur couple de serrage.

Rapport de vérification générale périodique

Chariot élévateur à mât

CHARIOT ELEVATEUR

Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22



Client SOCIÉTÉ CLIENTE
Adresse masquée

Lieu SITE D'INTERVENTION
Adresse masquée

Numéro de rapport	Date de visite	Prochaine vérification	Périodicité contractuelle	Périodicité réglementaire
112026117354 Rev 00	09/11/2026	09/05/2027	6 mois	6 mois

Constructeur : FENWICK **Energie :** Electrique

Type : X50-01 **Heures :** 2 015 **N° Parc :** XXXX

N° Série : H2XXXXXXX0X7 **Immatriculation :** XX

Date Acquisition Non précisé **Fabriqué en :** 2025

Résultat du contrôle

01 ACCES INSTALLES A DEMEURE

01.02 Autres accès pour entretien et vérification

01.02.06 Porte d'accès à la batterie côté droit Détériorée - Voir photo

03 CHARPENTE

03.02 Tablier - Butées

03.02.02 Absence d'arrêtoirs de fourches sur le tablier - Voir photo

08 SUSPENTE - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION

08.04 Dispositifs de préhension (fourche)

08.04.03 Tenons ou arrêtoirs des bras de fourches absents bras de fourche avant gauche et avant droit . Cale fourche gauche présente desserrée . - Voir photo

09 MECANISMES ET HYDRAULIQUE

09.02 Vérins et canalisations

09.02.06 Défaut d'étanchéité verin écarteur bras de fourche gauche - Voir photo

09.02.10 Détérioration du vérin hydraulique Tiges de vérins écarteurs bras de fourche gauche déformée - Voir photo

09.02.17 Détérioration des flexibles - Voir photo

Avis général : **Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défectuosités ci-dessus auxquelles il y a lieu de remédier.**

L'inspecteur

JONARD Eric

Signature masquée

Signature masquée

Le client

Nom masqué

La personne ayant présenté l'appareil reconnaît avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que l'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrôlés. Seuls les points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.

Rapport de vérification générale périodique

Chariot élévateur à mât

CHARIOT ELEVATEUR

Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22



Hauteur maximale d'élévation (m) : 4.52

TYPE

A conducteur portée

Porte à faux à prise frontale

Mât vertical triple

MARQUAGE

Plaque constructeur avec marquage CE

CAPACITE

Charge maximale d'utilisation (C.M.U.) (kg) : 4550

CDG à (mm) : 500

Hauteur de levage (m) : 4.525

BATTERIES

Poids minimal définis par le constructeur (Kg) : 1385

Poids maximal définis par le constructeur (Kg) : 1458

Poids réel relevé sur les batteries (Kg) : 1458

EQUIPEMENTS

Cabine fermée

Pare brise avant

Pare brise arrière

Vitre toit

Rétroviseur intérieur

Rétroviseur extérieur droit

Rétroviseur extérieur gauche

Pneus pleins souples

Feux de travail

Feu(x) de recul(s)

Caméra de recul

Gyrophare / Feux à éclats

Buzzer sur marche arrière

Avertisseur sonore

Ceinture de sécurité

Contact de siège

Contact de détection de bouclage de ceinture

Arrêt d'urgence

Vérins hydrauliques levage (Nombre) : 3

Vérins hydrauliques d'inclinaison (Nombre) : 2

CHAINES A MAILLES JOINTIVES

Quantité : 1

Pas d'origine (mm) : 31.75

Autre(s) : Pas mesuré sur 10 maillons 318 mm

CHAINES A MAILLES JOINTIVES 2

Quantité : 2

Pas d'origine (mm) : 25.4

Autre(s) : Pas mesuré sur 10 maillons 255 mm

ORGANES DE PREHENSION

Fourches

Epaisseur d'origine (mm) : 6

Epaisseur mesurée des fourches (mm) : 6.2

Longueur (cm) : 220

ACCESSOIRES RATTACHES

Tablier à déplacement latéral

Ecarteur de fourches

LOCALISATION

Hangar

ESSAIS EN CHARGE

Les essais ont été réalisés avec la CMU

Hauteur de levée (m) : 2

Charge autorisée (kg) : 4550

Charge installée (kg) : 4600

Portée (m) : 0.5

DISPOSITIONS PRISES POUR LA VERIFICATION

Notice d'instruction présente

Déclaration ou certificat de conformité présent

Rapport de vérification précédent présent

Carnet de maintenance présent

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR LES ESSAIS

Charge fournit par le client

Bloc(s) d'acier

Rapport de vérification générale périodique

Chariot élévateur à mât

CHARIOT ELEVATEUR

Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22




Liste des points soumis à vérifications


01	**ACCES INSTALLES A DEMEURE**
01.01	Accès à la cabine, au poste de conduite
01.02	Autres accès pour entretien et vérification
02	**CHASSIS**
02.01	Ossature - Contrepoids
02.02	Organes de roulement (pneumatiques, bandages, galets)
02.03	Stabilisateurs - Blocage de suspension
03	**CHARPENTE**
03.01	Mât - Guidages - Galets - Butées
03.02	Tablier - Butées
03.03	Liaisons - Assemblages - Articulations
04	**SOURCE D'ENERGIE**
04.01	Dispositif de séparation générale
04.02	Equipement et canalisation
04.03	Protection des pièces nues sous tension
05	**ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL**
05.01	Eclairage de la zone de travail
05.02	Autres éclairages ou signalisation incorporés à l'appareil
06	**POSTE DE CONDUITE**
06.01	Constitution - Fixation - Plancher
06.02	Protection contre les chutes en hauteur
06.03	Protection du conducteur (protège tête, dosseret, bouclier)
06.04	Plate-forme rabattable
06.05	Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseur)
06.06	Chauffage
06.07	Extincteur sur l'appareil ou sur site
06.08	Siège
06.09	Ceinture de sécurité
06.10	Eclairage
07	**ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE**
07.01	Mise en marche - Arrêt normal - Sélecteur
07.02	Interdiction d'emploi (appareils mobiles)
07.03	Identifications des organes de service
07.04	Retour automatique au point neutre
07.05	Timon
07.06	Avertisseur sonore, lumineux
07.07	Indicateurs
08	**SUSPENTE - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION**
08.01	Suspentes (câbles ou chaînes)
08.02	Attaches
08.03	Tambours - Poulies - Noix - Pignons
08.04	Dispositifs de préhension (fourche)
08.05	Dispositifs de préhension (godet, pinces, éperon...)
09	**MECANISMES ET HYDRAULIQUE**
09.01	Organes de transmissions - Accouplements
09.02	Vérins et canalisations
09.03	Frein des mouvements concourant au levage
09.04	Limitation de vitesse (absence d'emballement)
09.05	Freins du mouvement de translation
09.06	frein d'immobilisation en translation
09.07	Protection des organes mobiles de transmission
10	**DISPOSITIFS DE SECURITE**
10.01	Limiteur de course haute ou dispositif équivalent
10.02	Autres limiteurs de course, hors course
10.03	Contrôle de présence du conducteur (siège, pédale...)
10.04	Sécurité de timon
11	**PRESCRIPTIONS DIVERSES**
11.01	Affichage capacité - Tableaux des charges
11.02	Consignes de sécurité (lisibilité)
11.03	Notice d'instructions
11.04	Déclaration de conformité - Marquage CE ou Epsilon - Certificat de conformité
12	**EPREUVES - ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE**
12.01	Essais
12.02	Examen d'adéquation




Photos prises lors de la vérification

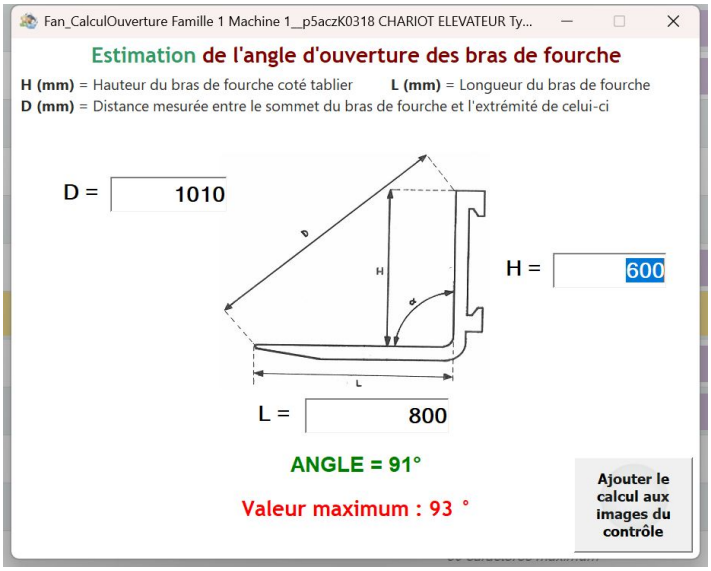


Calcul ouverture bras fourche

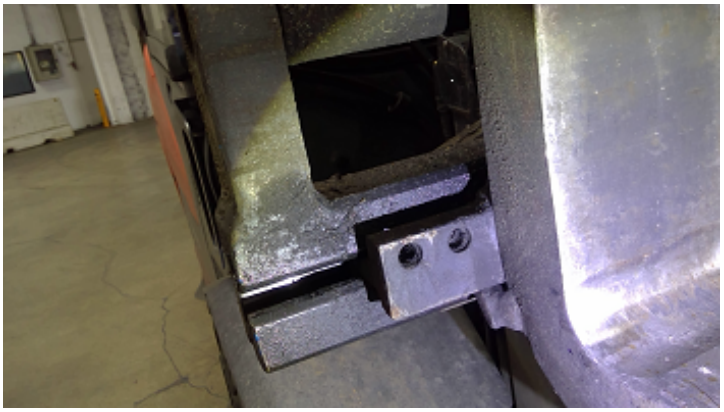

Observation 030202 : Absence d'arrêtoirs de fourches sur le tablier

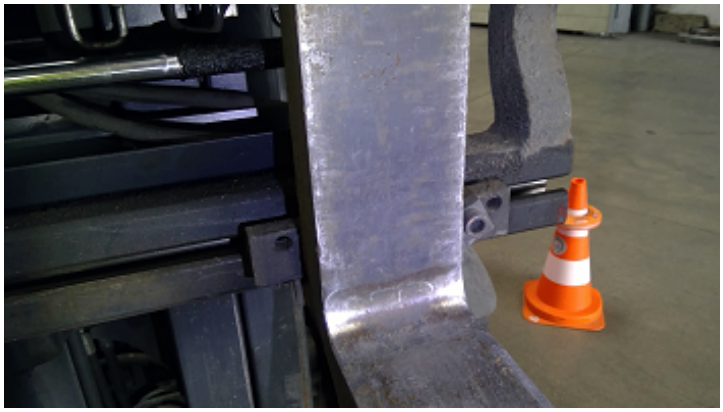


Observation 080403 : Tenons ou arrêtoirs des bras de fourches absents
bras de fourche avant gauche et avant droit . Cale fourche gauche présente desserrée .

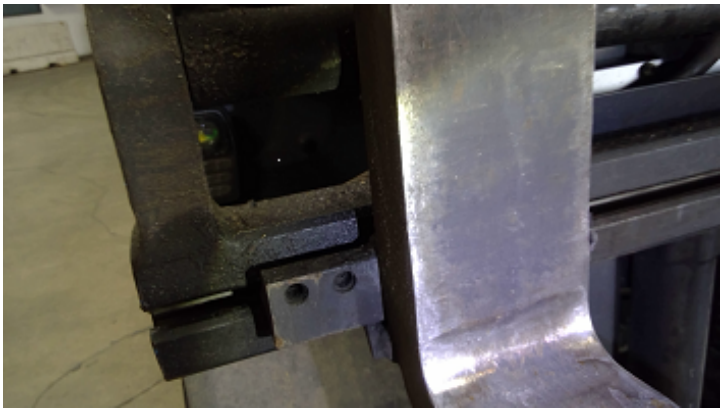

Observation 080403 : Tenons ou arrêtoirs des bras de fourches absents
bras de fourche avant gauche et avant droit . Cale fourche gauche présente desserrée .




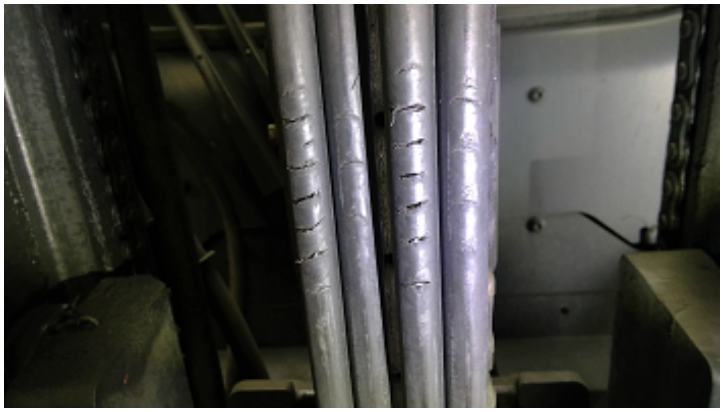


Observation 090217 : Détérioration des flexibles



Observation 090206 : Défaut d'étanchéité
verin écarteur bras de fourche gauche

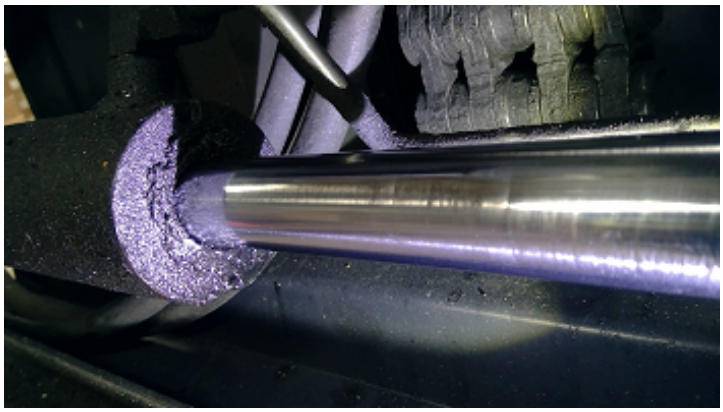

Observation 090206 : Défaut d'étanchéité
verin écarteur bras de fourche gauche

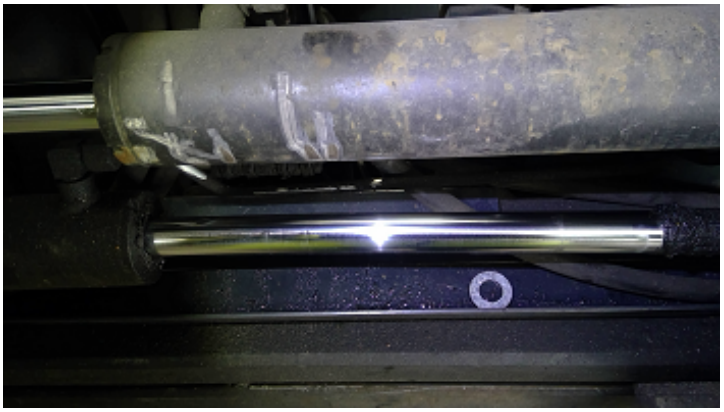

Observation 090210 : Détérioration du vérin hydraulique
Tiges de vérins écarteurs bras de fourche gauche déformée





Observation 010206 :
Porte d'accès à la batterie côté droit Détériorée
